

ЭКСПЕРТНЫЙ ФОТО-АУДИТ WHITE BOX, АНАЛИЗ ЧЕК-ЛИСТА И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 (43.2 м², 5/5 эт., кирпич 1966 г.) | Дата аудита: 14.09.2026 | Партнёр проекта: Hermes Agent

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ПО ЧЕК-ЛИСТУ (ОТВЕТЫ АЛЕКСЕЯ):

- Перепад пола в санузле: максимум -4.0 см (отличный показатель — подтверждает заливку полусухой стяжки М300 с фиброй без наливного пола).
- Завалы стен санузла: от 0.5 до 1.5–2.0 см (отказ от маячной штукатурки! Протяжка цементом под 90° только в зоне ванны 150 см, остальное — плиточный клей под гребёнку).
- Остаток материалов по штукатурке/шпаклёвке: 0 кг (израсходовано на 100%). Точный расчёт, отсутствие замороженного капитала на объекте.

1. Санузел 2.9 м²: Анализ фотофиксации и регламент на 15.09.2026



Выявленные факты на объекте:

1. Основание пола: старая плитка сбита до плиты. Сквозные глубокие гильзы вокруг стояков канализации и воды на 4-й этаж.
2. Канализационный стояк: в полу открыт чугунный раструб, заглушенный ветошью. Счётчик ХВС расположен в нижней части ниши.
3. Стены: сбиты в рабочей зоне, вверху остатки масляной краски. Световое окно на кухню полностью демонтировано (проём чистый).

Критические инженерные правила на 15.09:

- Канализация СТРОГО ДО стяжки: расчистить чугунный раструб, установить переходную манжету 123/110 на пластик и выставить трассу 50 мм под ванну с уклоном 2–3 см/м до заливки бетона.
- Герметизация гильз: зачеканить отверстия вокруг стояков густым безусадочным раствором во избежание протечки к соседям снизу.
- Уровень стяжки М300: верх стяжки на отметке -3.5 см от чистового коридора (норма СП 29.13330 — чаша безопасности).
- Короб и люк: в каркасе из профиля Knauf 50x40 предусмотреть скрытый ревизионный люк не менее 40x50 см к счётчику и крану.

2. Кухня 6.0 м² и открытый портал: Эргономика и экономия




Решение по двери в кухню (Утверждено):

- Дверь НЕ СТАВИМ: в кухне 6 м² распашное полотно блокирует эргономику (подход к столу/гарнитуру). Открытый проём объединяет прихожую и кухню, даёт естественный свет и ощущение воздуха.
- Экономия: чистая экономия бюджета ~13 000 Р (полотно, коробка, доборы, фурнитура, монтаж).
- Формирование портала: опустить верхнюю перемычку из профиля 50x40 и ГСП на стандартную высоту остальных дверей (2.05–2.07 м), правый торец зашить ГСП и вывести в плоскость со стенами коридора.

Критический путь — замер кухни:

- Зашить окно в с/у влагостойким ГСП с закладкой шумоизоляции.
- Протянуть рабочую стену гарнитура 2м правилом на сдир (для идеальной посадки верхних шкафов и фартука).
- Вызвать замерщика кухни сразу после протяжки (срок кухни 10–14 дней).

3. Жилые комнаты и прихожая: White Box и премиальные акценты

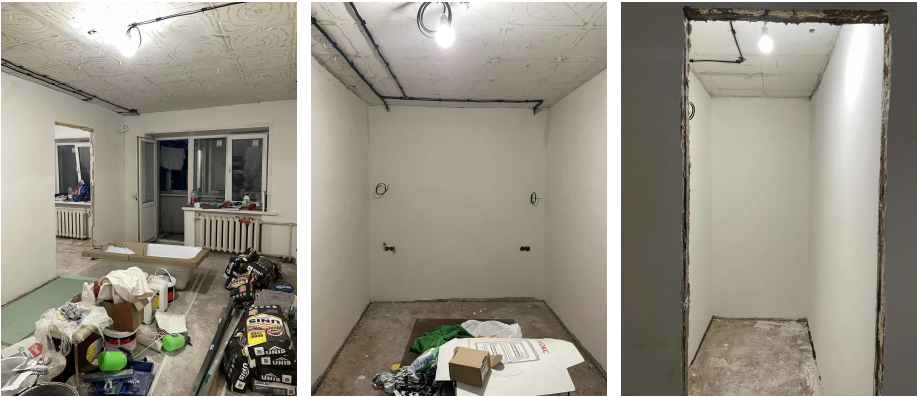

Анализ качества White Box и инженерии:

- Зал 18.5 м²: стены выведены в единый белый контур правилами. Плитка на потолке сохранена — натяжной потолок перекроет её с минимальным опуском. Балконный блок ПВХ в порядке.
- Спальня 12.6 м² (Топовое решение): симметричная разводка розеток и настенных бра над тумбами изголовья — ключевой продающий триггер (ощущение дизайн-проекта). Откосы окна с рассветом.
- Прихожая 2.5 м²: новый щит аккуратно смонтирован. Старый счётчик распломбирован (доплат электрику нет, ниша глушится/закрывается люком). Складирован керамогранит 60x120 Calacatta.

Гардеробная 2.5 м² (Конкурентное преимущество):

- Превращение советской кладовой в современный Walk-in Closet.
- Внутри стены зашпаклеваны, смонтирован верхний свет и розетка/выключатель.
- Очистить проём от трухи и старой пены, подготовить под аккуратное полотно/портал. Внутри: торцевая штанга под одежду + полки 30 см по длинной стене.

4. Чек-лист приёмки штукатурно-шпаклёвочных работ перед расчётом (15.09.2026)

Завтра мастер завершает финишную затирку (шлифовку). Провести контроль по 5 критериям перед выплатой остатка:

Зона контроля	Что именно проверять	Инструмент проверки	Критерий допуска к приёмке	Отметка
1. Плоскость стен	Отсутствие наплывов шпаклевки, риск от шпателя и ступеней	Боковой луч прожектора / лампы под 15–20°	Ровная матовая плоскость под обои/грунт	[OK]
2. Зона плинтуса	Нижние 10–15 см стен у пола (примыкание к стяжке)	Правило 1.5–2.0 м приложить горизонтально у пола	Просвет не более 2 мм (для жесткого белого плинтуса 80 мм)	[OK]
3. Дверные проёмы	Вертикальность и плоскость зон будущих наличников (по 10 см от проема)	Уровень / правило 2.0 м вертикально	Наличники встанут заподлицо без щелей к стене	[OK]
4. Откосы окон	Четкость внешних малярных уголков, отсутствие сколов и трещин	Визуальный осмотр + угольник	Угол рассвета равномерный, грани острые и прочные	[OK]
5. Защита окон/щита	Очистка от пыли подоконников, снятие пленок с профилей ПВХ	Визуальный контроль	Щит заклеен скотчем, окна целые без царапин	[OK]

5. Финансовая сводка и экономия на текущем рубеже (Неделя 3)

- Факт расходов проекта: 316 021.27 Р (включая всю сантехнику, плитку 60x120, пескобетон, ГСП, доставку, подъем и демонтаж старой плитки).
- Подтвержденная экономия ниже рынка: 47 563.00 Р (за счет оптимизации черновых решений, оптовых закупок и сохранения живых конструкций).
- Экономия на двери кухни: дополнительно высвобождает ~13 000 Р, сохраняя бюджет в рамках целевого лимита 620–650 тыс. Р.
- Порядок внесения выплаты: после финальной приёмки и оплаты мастеру сумма будет внесена отдельной строкой в Excel, Google Sheets (ID: 1Vb7Dwq5rQOxOqkXz4mztu4jChDiOrNpXuCR5I2Lva6E) и Obsidian по регламенту Executive Navy & Emerald.
