

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 (2-комн. 43.2 м², 5/5 эт.) | Узел: Дверной проём кладовой/гардеробной (~2.5 м²)

Цель документа: Наглядно и в цифрах сравнить два сценария перед стартом демонтажных и электромонтажных работ Недели 2. Ремонт выполняется под продажу по максимальной планке рынка (5 600 000 Р / 129 600 Р/м²). Каждое планировочное решение оценивается строго по правилу флиппинга: «Поднимает ли это ликвидность и восприятие цены покупателем, или только экономит копейки на черновой стадии?».


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ	ВАРИАНТ А: Оставить проём в зале (Как было в советской планировке)	ВАРИАНТ Б: Перенести в спальню (Рекомендованный флиппинг-стандарт)
1. Эргономика зала (18.5 м²)	❑ «Проходной двор» с 4 дверями: вход из прихожей, балкон, спальня, кладовка. Стена полностью разбита. Нет возможности разместить ТВ-зону 55–65" и тумбу напротив дивана. Диван зажат между проходами.	❑ Идеальная ТВ-зона: Глушится проём из зала → формируется монолитная 3.5-метровая акцентная стена. Свободно встаёт ТВ 65", консоль и угловой диван. Пространство гостиной целостное.
2. Маркетинг и позиционирование	❑ Восприятие: «Советский чулан». На показе покупатели видят темнушку под пылесос и соленья. В спальне 12.6 м² придется ставить громоздкий шкаф-купе, который «украдет» объем и воздух.	❑ Восприятие: «Мастер-спальня с гардеробной». Сильнейший триггер для женщин и молодых пар. Гардеробная комната (Walk-in Closet) выглядит статусно, как в бизнес-классе. Спальня свободна.
3. Бытовой сценарий	❑ Неудобная логистика: Чтобы одеться после сна/душа, нужно идти через весь зал (где могут быть гости или дети) за вещами в чулан.	❑ 100% приватность: Одевание, зеркало, белье и гардероб находятся прямо внутри приватного контура спальни.
4. Бюджет работ и материалов	0 Р (мнимо «бесплатно»)	~8 000 – 9 000 Р (2 листа ГКЛ, профили, минвата Акустик, прорезка проема в перегородке и зашивка).
5. Влияние на продажу (5.6М)	❑ Дисконт к восприятию -100 000 Р ... -150 000 Р, затяжка экспозиции на 3–5 недель из-за ощущения тесноты и старой планировки.	❑ Ускорение продажи в 2 раза, оправдывает верхний ценник 5.6М на фото и живых показах. Окупаемость вложений: x12–x15.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

ВАРИАНТ А (ХУЖЕ): Дверь в зале



ВАРИАНТ Б (РЕКОМЕНДУЕМ): Дверь в спальню

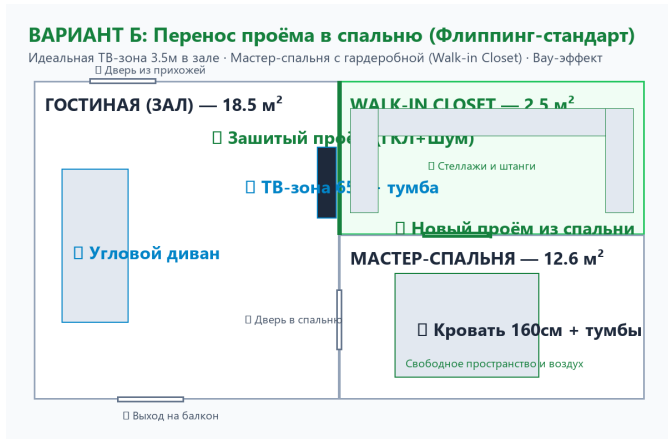

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ И СМЕТА УЗЛА

Перегородка между спальней и кладовкой в домах серии 1-447 является ненесущей (гипсопрокатная/дощатая перегородка толщиной 80 мм). Прорезка проема не затрагивает капитальные конструкции дома и выполняется аккуратно сабельной пилой или болгаркой с пылесосом за 2–3 часа.

Позиция / Материал	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Где закупается / Назначение
ГКЛ Кнауф влагостойкий/стандарт 12.5 мм	2 листа	480 Р	960 Р	ТК «Чипак» / Лемана ПРО (зашивка проема из зала)
Профиль стоечный ПС 50/50 + ПН 50/40	4 шт	240 Р	960 Р	Каркас перегородки под зашивку
Минвата звукоизоляционная (Акустик 50 мм)	1 упак.	950 Р	950 Р	Шумоизоляция между ТВ-зоной зала и спальней
Крепеж, саморезы, серпянка, унифлот	комплект	500 Р	500 Р	Расходники для стыков и монтажа
Работа мастера: прорезка проема + зашивка старого	1 узел	5 000 Р	5 000 Р	Выполняется разнорабочим / мастером в Неделю 2
ИТОГО ЗАТРАТ НА ПЕРЕНОС ПРОЕМА:	—	—	8 370 Р	Окупается при первом же просмотре покупателем

ОПЫТ РЕАЛЬНЫХ ФЛИППИНГ-ПРОЕКТОВ (СЕРИЯ 1-447, 43–44 М²)

В нашей базе реализованных кейсов флиппинга хрущевок 43–44 м² (Кейс Анастасии, проекты InMyRoom) 100% успешных и быстро проданных объектов использовали именно это решение:

1. Пространство гостиной визуально увеличивается в 1.5 раза, так как взгляд не цепляется за двери по углам.
2. В спальне организуется закрытый Walk-in Closet с открытыми металлическими штангами и полками ЛДСП (бюджет наполнения гардеробной ~6 000 Р в Леруа/Чипак), что полностью исключает покупку шкафа за 25 000–35 000 Р.
3. Экономия на мебели: Отказ от шкафа-купе в спальне экономит больше денег (~25 000 Р), чем стоит весь перенос проема с зашивкой (~8 400 Р)!

ИТОГОВЫЙ ВЕРДИКТ И РЕКОМЕНДАЦИЯ HERMES:

Оставить проём в зале — это ложная экономия. Она сбережет 8 370 Р в моменте, но:

- Вынудит потратить 25 000 Р на шкаф в спальню (чистый убыток 16 600 Р).
- Сломает ТВ-зону в зале и снизит привлекательность квартиры для платежеспособных покупателей.

Решение: Дать команду электрикам в понедельник разводить проводку с учетом зашивки проема в зале под ТВ и вывода света в мастер-гардеробную из спальни.
